

Situația finală a proiectelor POR 2014 - 2020 ale Primăriei Timișoara

Nr. crt	Cod SMIS	Titlu proiect	Data semnării contractului	Valoarea totală nedecontabilă, din cauza neîncadrării în termene, pe POR 2014 - 2020, încheiat la 31.12.2023, estimată a fi necesară pentru achitarea obligației de finalizare a proiectelor până la 31.12.2024	BUGET TOTAL Implementare	BUGET ELIGIBIL Implementare	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare	Valoare eligibilă autorizată și în curs de autorizare	Absorbție la 31.12.2023 % (col 6 / col 4)
				1	3	4	5	6	7
1	117520	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I	2018 08 08	2,537,282.45	2,916,654.32	2,886,854.81	1,732,112.88	60,886.88	2.11%
2	116928	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Alcea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului	2018 09 20	-	5,723,962.63	5,596,130.96	3,357,678.56	1,895,203.23	33.87%
3	119305	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Stiintei nr. 3-5	2019 02 28	1,654,531.72	1,905,444.04	1,857,066.12	1,114,239.66	16,827.79	0.91%
4	119739	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Nicolae Titulescu nr. 10A	2019 02 28	496,925.33	2,595,740.05	1,570,100.03	942,060.02	916,164.70	58.35%

5	121134	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str.Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernauti nr.10:12:14, str.Topologului nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1,sc.A, str.Arges nr.4, B-dul Cetatii nr.30, str.Rasaritului nr.5	2019 02 28	3,863,000.39	6,120,041.67	4,385,171.52	2,631,102.92	83,653.98	1.91%
6	119790	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui - Odobescu - Complex	2019 03 19	1,098,100.26	3,528,803.04	3,373,709.01	2,024,225.40	1,938,237.85	57.45%
7	121436	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31	2019 03 19	4,514,512.34	6,284,359.67	6,081,365.04	3,648,819.02	958,716.20	15.76%
8	121543	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42	2019 03 19	9,649,178.35	10,857,214.22	10,778,457.38	6,467,074.41	51,433.29	0.48%
9	117379	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu	2019 04 09	39,517.85	753,592.08	751,986.08	451,191.65	637,269.62	84.74%
10	121133	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: Zona Take Ionescu-Torontal	2019 04 09	4,128,775.93	4,626,787.25	4,626,787.25	2,776,072.35	35,332.60	0.76%
11	121578	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii	2019 04 09	7,866,618.00	9,102,613.49	8,888,803.33	5,333,281.96	133,305.00	1.50%

12	121587	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A	2019 04 09	3,778,894.75	7,587,740.66	4,223,970.19	2,534,382.11	22,678.42	0.54%
13	121198	Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara	2019 04 16	-	6,818,454.74	6,808,464.74	6,672,295.44	4,421,975.00	64.95%
14	121240	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C	2019 04 16	2,352,569.15	2,945,452.32	2,927,439.98	1,756,463.99	282,186.83	9.64%
15	121249	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocului de locuinte situat pe str. Arieș nr.20	2019 05 20	2,888,140.03	3,250,448.98	3,224,517.79	1,934,710.68	13,925.98	0.43%
16	117404	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului	2019 06 04	3,370,636.81	3,778,590.27	3,760,093.12	2,256,055.88	13,447.00	0.36%
17	121538	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D și B-dul Take Ionescu, nr.11-13	2019 06 04	3,789,186.36	4,283,975.35	4,265,286.91	2,559,172.15	49,571.86	1.16%
18	127750	Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord	2019 06 11	319,826.60	7,879,340.78	1,039,037.24	1,018,256.49	719,210.64	69.22%
19	121232	Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent	2019 06 25	-	4,352,023.93	3,894,963.18	3,817,063.92	3,720,723.05	95.53%
20	120790	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18	2019 06 25	2,101,917.17	2,386,676.41	2,386,676.41	1,432,005.84	46,091.60	1.93%
21	125504	Construcție clădire cu destinația creșă str. Cocea	2019 07 09	2,231.25	7,774,265.68	1,361,497.06	1,334,267.11	1,359,265.81	99.84%

22	123654	Înnoirea flotei de tramvaie - etapa 1	2019 07 23	-	81,223,027.55	68,272,983.80	66,907,524.12	56,661,978.57	82.99%
23	126783	Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente	2019 07 23	4,067,231.99	10,592,285.48	10,591,749.98	10,379,914.98	5,474,559.79	51.69%
24	129119	Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor	2019 07 23	388,901.98	7,724,298.52	1,313,595.36	1,287,323.45	793,333.84	60.39%
25	121401	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”	2019 08 07	4,848,888.09	5,477,296.87	5,452,159.03	3,271,295.42	58,055.04	1.06%
26	126376	Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatorului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala	2019 09 10	2,707,192.46	23,681,293.35	10,693,824.31	10,479,947.82	5,501,537.58	51.45%
27	129030	Înnoirea flotei de tramvaie- etapa II	2019 10 01	-	96,378,403.45	81,008,590.95	79,388,419.13	66,416,215.50	81.99%
28	123184	Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor	2019 10 01	9,150,000.00	130,479,397.84	91,484,842.92	89,655,146.06	65,290,224.43	71.37%
29	121017	Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional	2019 11 19	-	5,729,005.05	5,692,734.07	5,578,879.38	-	0.00%
30	121016	Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare	2019 12 03	-	4,381,944.27	4,312,961.51	4,226,702.28	-	0.00%
31	129105	Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu	2019 12 18	4,864,000.00	32,948,274.33	29,336,879.86	28,750,142.26	11,801,418.15	40.23%

32	129031	înnoirea flotei de tramvaie - etapa III	2020 05 04	1,762,659.56	96,378,403.45	69,452,340.95	68,063,294.13	67,689,681.39	97.46%
33	126909	Extindere iluminat public în Parcul Botanic	2020 05 08	-	3,820,894.23	3,789,387.13	3,713,599.39	2,439,182.08	64.37%
34	122504	Construire sală sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara	2020 07 22	5,502,111.55	9,050,302.93	9,050,302.93	8,869,296.86	2,643,161.09	29.21%
35	121023	Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr.30 din Timisoara, corp A, B si C cu doua corpuri D si E in regim D+P+2	2020 10 06	2,560,000.00	24,345,729.44	24,345,729.44	23,858,814.85	10,477,661.00	43.04%
36	124711	Construcție și dotare Liceu Waldorf	2020 12 23	19,506,553.60	13,688,600.04	13,688,600.04	13,414,828.00	7,260,534.84	53.04%
37	140971	Cladire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea de Centru Cultural si Educațional Kuncz	2021 02 12	-	7,017,973.83	2,375,750.00	2,328,235.00	2,175,445.76	91.57%
38	134130	Construire corp P+1E la Scoala Gimnaziala nr.13 din Timisoara, str. Muzicescu nr.14	2021 11 18	2,937,048.55	3,990,241.12	3,797,162.07	3,721,218.82	860,113.52	22.65%
39	152020	Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă	2021 12 23	3,018,630.80	3,544,467.14	3,511,841.44	3,441,604.63	142,026.50	4.04%
40	150181	Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”	2022 03 01	2,084,724.05	2,318,260.05	2,316,360.05	2,270,032.85	-	0.00%
41	155411	Reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr. 6, str.Tepes Voda (Ismail) nr. 17	2022 09 06	1,917,609.82	3,265,366.48	2,130,677.58	2,088,064.03	-	0.00%
42	155705	Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E	2022 09 06	2,307,179.54	2,725,640.26	2,654,739.85	2,601,645.06	82,086.33	3.09%
				122,074,576.70	674,233,287.26	529,961,591.42	490,088,460.96	323,143,322.74	60.97%
		Fără tramvaie:		120,311,917.14	400,253,452.81	311,227,675.72	275,729,223.58	132,375,447.28	42.53%

Nr. crt	Cod SMIS	Titlu proiect	Data semnării contractului	Valoarea totală nedecontabilă, din cauza neîncadrării în termene, pe POR 2014 - 2020, încheiat la 31.12.2023, estimată a fi necesară pentru achitarea obligației de finalizare a proiectelor până la 31.12.2024	BUGET TOTAL Implementare	BUGET ELIGIBIL Implementare	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare	Valoare eligibilă autorizată și în curs de autorizare	Absorbție la 31.12.2023 % (col 6 / col 4)
---------	----------	---------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------


Fonduri absorbite
42.53%

Fonduri pierdute
57.47%


Fonduri absorbite
60.97%

Fonduri pierdute
39.03%

Calculând absorbția de fonduri europene realizată de Administrația Fritz fără sumele conexe celor 23 tramvaie, doar recepționate și-atâta tot de Administrația Fritz, rezultă că aproape 60% din ceea ce a lăsat Administrația Robu pentru restul proiectelor,

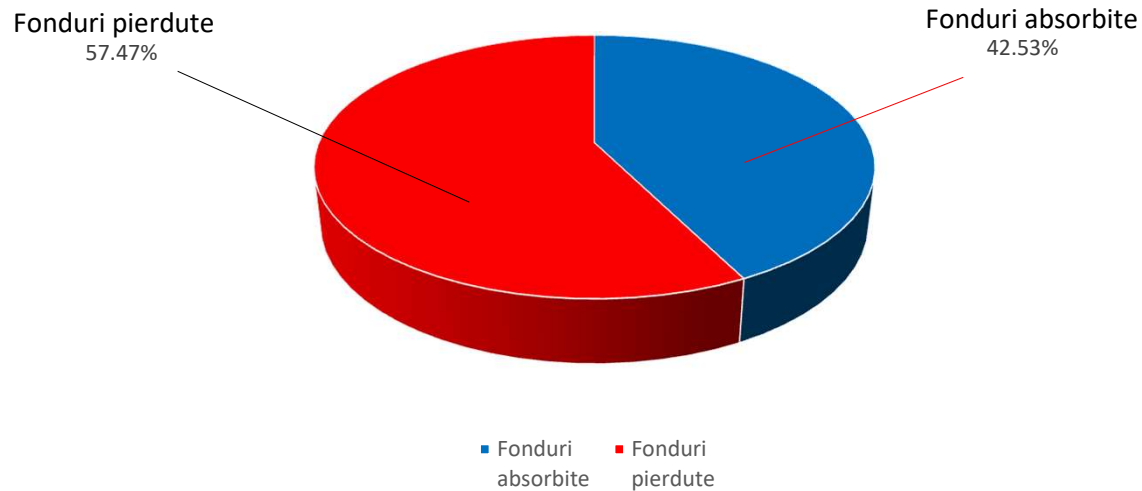

Absorbția de fonduri europene realizată de Administrația Fritz. Evident, aproape 40% din ceea ce a lăsat Administrația Robu, prin proiectele sale, ca fonduri europene atrase, aprobate, a fost pierdut de Administrația Fritz.

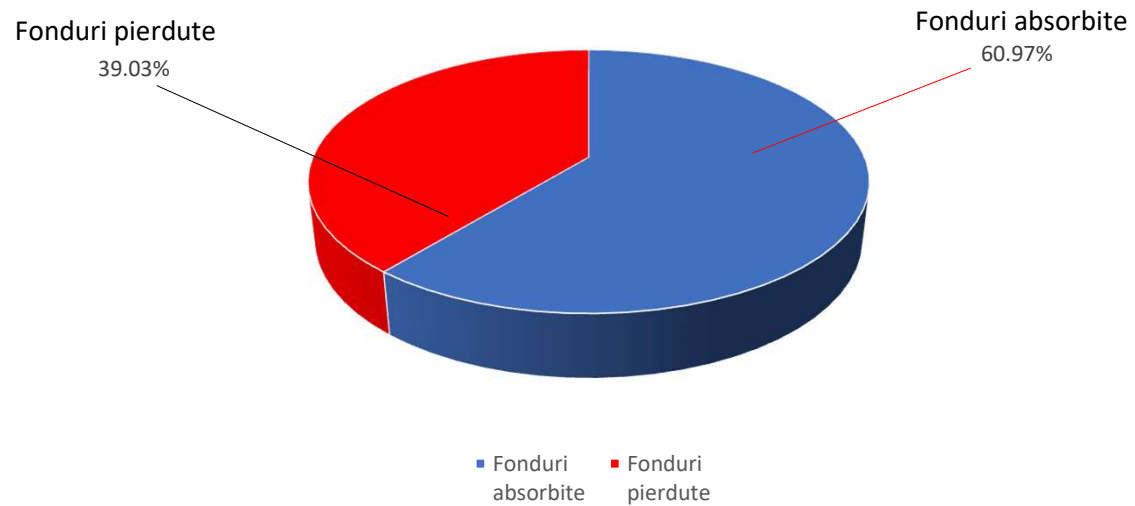

N P

1,039,037.24	719,210.64
--------------	------------

1,361,497.06	1,359,265.81
--------------	--------------

1,313,595.36	793,333.84
--------------	------------

3,714,129.66 2,871,810.29

77.32%
